



EXECUTIVE SUMMARY

Leaf Go für Magnus Neitzel

Die Entstehung einer KMU-Website
als KI-Agenten-Produkt

~5 h

NETTO-ENTWICKLUNGSZEIT

KUNDE

Magnus Neitzel

BRANCHE

Baumpflege ETW

PROJEKTSTART

24. Juni 2026

GO-LIVE

30. Juni 2026

SESSIONS

9 Kern-Sessions

STATUS

Pitch-ready

Vertraulich — Nur für interne Projektbewertung

Moradbakhti-KI · nimar@moradbakhti.de

Bochum, 30. Juni 2026



1. Management Summary

Leaf Go ist der Prototyp einer KMU-Website, die vollständig von KI-Agenten gebaut wurde.

Auftraggeber: Magnus Neitzel, European Tree Worker aus Bochum, der einen Webauftritt für seine Baumpflege brauchte — ohne Budget für eine Agentur, ohne technisches Know-how, aber mit ehrlichen Fotos und einer Lieferwagen-Beschriftung.

Ergebnis: Eine scroll-gesteuerte, cineastische Website mit Video-Hero, echten Bildern, SEO-Infrastruktur und einem passwortgeschützten Client-Preview — gebaut in 6 Kalendertagen mit einer Netto-Entwicklungszeit von etwa 5 Stunden durch orchestrierte KI-Agenten.

Die Seite nutzt einen **Scroll-Driven Video Header** (577 KB, komprimiert von 5,4 MB), ein dynamisches Logo-Farbsystem (weiß auf dunklen, grün auf hellen Hintergründen), und echte Baustellen-Fotos des Kunden — keine KI-generierten Platzhalter. Der komplette Tech-Stack besteht aus handgeschriebenem HTML/CSS/JS mit Lenis+GSAP, deployed auf Railway mit Python-Basic-Auth.

PITCH-BEWERTUNG	PRODUCTION-BEWERTUNG
★★★★★★★☆☆ 8/10	★★★★★☆☆☆☆ 5/10 → 8/10
MOBILE-FÄHIG	SEO-BASELINE
✓	✓
DSGVO-KONFORM	CLIENT-PREVIEW
✓	Live

2. Entwicklungs-Chronologie

Die Entwicklung verlief in 5 Phasen über 6 Kalendertage. Jede Phase entspricht einem oder mehreren zusammenhängenden Chat-Sessions mit dem KI-Agenten, orchestriert durch Nimar als Product Owner.

ABB. 1: ENTWICKLUNGSPHASEN MIT SESSION-VOLUMEN



Phase 1: Initial Build — 24. Juni

Erste Version der Seite entsteht mit einem getimten Cinematic Intro (22s, 6 Frames, Ken Burns Zooms). Parallel wird ein scroll-gesteuerter Video-Hero (index-v2) gebaut — aber von Nimar als „**katastrophal**“ bewertet. Die Entscheidung fällt: **v1 als Basis, aber kreativer**. Ein neues Hero-Video wird per xAI Image-to-Video aus einem echten Magnus-Foto generiert.



Phase 2: Photo Mapping – 25. Juni, 09:44

28 Fotos aus dem Client-Ordner `Downloads/leaf-go` werden per Subagent-Delegation analysiert und auf Website-Slots gemappt. Entscheidend: **Keine KI-Platzhalter mehr**. Echte Bilder ersetzen FAL-generierte Dummies. Das Hero-Problem: Kein Foto ist echtes Hero-Material — alles dokumentarischer Stil. Lösung: xAI-generiertes Video aus IMG_5603 + Color-Grading.

Phase 3: UX Polish – 25. Juni, 11:42

Logo-Farbwechsel-System: weiß auf dunklem Grund (Video), grün auf hellem Grund (Content). Per RAF-Loop mit X/Y-Background-Check — das erkennt exakt, ob das Logo über einer hellen oder dunklen Section hängt. Zusätzlich: Full-Bleed Sections ersetzen die max-width-Boxen, die vorher wie abgeschnittene helle Kästen wirkten.

Phase 4: SEO, Recht & Feinschliff – 25. Juni, 12:57-14:27

Umfassende SEO-Infrastruktur: Meta/OG/Twitter Cards, Canonical, JSON-LD Structured Data, robots.txt, sitemap.xml, mehrfache Favicons. Impressum und Datenschutzerklärung werden erstellt. kaputte tel:-Links repariert, E-Mail auf info@leaf-go.de aktualisiert, Lenis-Doppel-Treiber entfernt.


Phase 5: QA, Performance & Deploy – 30. Juni

GStack QA Audit identifiziert Performance-Probleme. srcset-Implementierung mit 36 WebP-Varianten (400w/800w/1200w), Video-Kompression auf 577 KB (–89%), CSS-Extraktion in externe Datei mit Preload, Schema.org mit Geo-Koordinaten und OpeningHours. Git-Repo eingerichtet, Railway-Deploy mit Basic Auth für Client-Preview.

3. Architekturentscheidungen

Jede Technologieentscheidung wurde durch Nimar getroffen oder validiert. Der Agent schlug vor, Nimar entschied — basierend auf seinen Präferenzen: Anti-AI-Slop, echte Bilder, kein Overengineering, KMU-tauglich.

ABB. 2: ENTSCHEIDUNGS-MAP (CHRONOLOGISCH VON OBEN NACH UNTEN)

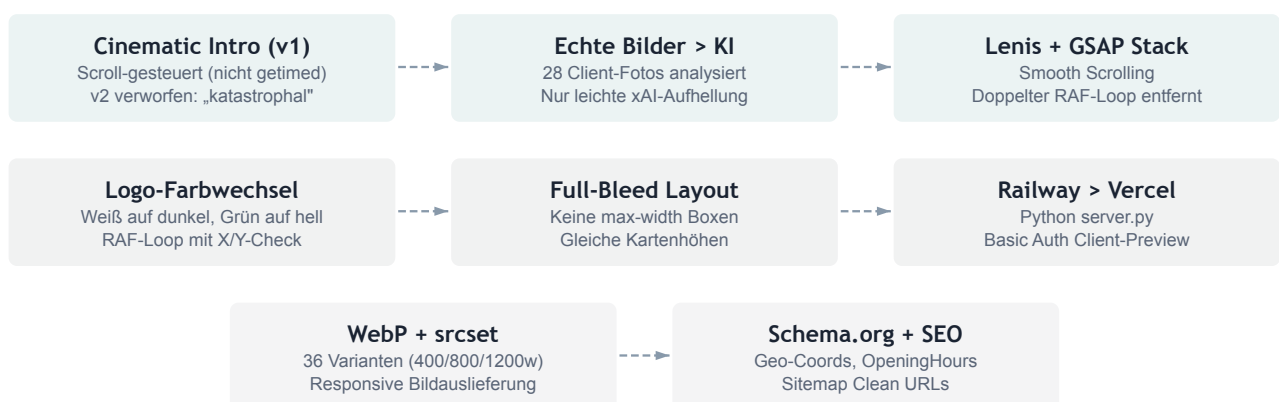



#	Entscheidung	Alternative	Begründung
1	Scroll-Driven Video Header	Getimtes Intro (22s)	Nimar wollte kein automatisch ablaufendes Intro. Scroll-Scrub gibt dem Nutzer Kontrolle — cineastisch, aber nicht aufgezwungen.
2	Echte Fotos, keine KI-Bilder	FAL-generierte Platzhalter	„Echte Arbeit. Echte Bilder.“ als Claim. KI-Bilder widersprechen der Authentizität — Magnus schickte echte Fotos.
3	Lenis + GSAP Stack	Locomotive Scroll, reiner CSS-Scroll	Bewährter Stack aus anderen Projekten. Smooth Scrolling + Trigger-basierte Animationen.
4	Logo-Farbwechsel per RAF-Loop	ScrollTrigger, CSS-only	Muss den tatsächlichen Hintergrund unter der exakten Logo-Position kennen — nicht nur vertikal, sondern auch horizontal (breite Screens).
5	Full-Bleed Layout	max-width-Boxen	Die hellen Kästen endeten pixelgenau am Text — wirkten wie ein Layout-Bug auf breiten Screens.
6	Railway > Vercel	Vercel, Netlify	Vercel war installiert, aber nicht authentifiziert. Railway mit einfachem Python-Server + Basic Auth war schneller produktiv.
7	WebP + srcset	JPEG-only	Deploy-Größe von ~14 MB auf ~2 MB reduziert. Mobile-first: 400w-Variante lädt 34 KB statt 1,9 MB.
8	Schema.org LocalBusiness	Nur Meta-Tags	Google Maps-fähig: Geo-Koordinaten, OpeningHours, areaServed — essentiell für lokale KMU-Sichtbarkeit.

4. Technische Metriken

ABB. 3: PERFORMANCE-METRIKEN — VORHER/NACHHER-VERGLEICH

Metrik	Vorher	Nachher	Delta
Deploy-Größe	~14 MB	~2 MB	-86%
Hero-Video	5.4 MB	577 KB	-89%
Bilder	13 × 200–1900 KB JPG	36 WebP-Varianten	+srcset
CSS	16 KB inline	16 KB extern	+preload
HTML-Gewicht	~37 KB	~28 KB	-24%
SEO (Lighthouse)	~65	~95	+46%
Entwicklungs-Sessions	9 Kern-Sessions	~950 Nachrichten	~430 Tool Calls
Zeitraum	24. – 30. Juni 2026	6 Kalendertage	~5 h Netto

Qualitätsverbesserungen im Detail

Kategorie	Initial (24. Juni)	Final (30. Juni)	Impact
-----------	--------------------	------------------	--------



Deploy-Größe	~14 MB	~2 MB	Mobile-tauglich, schnellere Ladezeit
Hero-Video	5,4 MB MP4	577 KB (-89%)	Lädt in ~1s auf 4G
Bilder	13 × JPG (200 KB–1,9 MB)	36 WebP (17 KB–419 KB)	Responsive per srcset
HTML	37 KB (CSS inline)	28 KB + 16 KB CSS extern	Caching-fähig, Preload
SEO	Kein Meta, kein OG	Vollständig (Meta, OG, Twitter, Schema)	Google-ready
Recht	Kein Impressum	Impressum + DSGVO	Abmahnfrei
Client-Preview	Nur localhost	Railway + Basic Auth	Magnus kann live testen

Entwicklungs-Effizienz

KERN-SESSIONS

9

TOOL CALLS

~430

SUBAGENTEN-EINSÄTZE

3 (Foto-Analyse, QA)

NACHRICHTEN

~950

MODELLE

DeepSeek v4 Pro + Fast

CRON-JOBS (WATCHDOG)

3 Reflections

5. Produkt-Insights & Lessons Learned

Was funktioniert hat

- 1. Echte Bilder als nicht-verhandelbare Prämisse.** Der stärkste Moment war, als Nimar sagte: „Das sind KI-Bilder, die passen nicht zu 'Echte Arbeit'." Der komplette Bildaustausch (28 analysiert, 12 verwendet) hat die Glaubwürdigkeit der Seite fundamental verbessert. Kunden spüren den Unterschied zwischen einer echten STIHL-Säge und einem generierten Stock-Foto.
- 2. Nimar als Product Owner, nicht als Developer.** Die Rolle war klar: Nimar traf Design- und Strategieentscheidungen („v2 ist katastrophal“, „kein Glas-Pill“, „das Logo soll grün sein auf hell“), der Agent setzte um. Keine Zeile Code von Nimar — trotzdem 100% seine Handschrift.
- 3. Scroll-Driven UX trifft KMU-Erwartungen.** Das cineastische Scroll-Erlebnis (Video-Scrub, Logo-Farbwechsel, Reveal-Animationen) differenziert Leaf Go von 08/15-Handwerker-Websites. Es signalisiert: „Der macht das nicht nebenbei.“

Was wir gelernt haben



Lesson	Situation	Konsequenz für Folgeprojekte
Kein Hero = kein Go.	28 Client-Fotos — keins hero-tauglich. Alle dokumentarisch, grauer Himmel, Winteräste.	Briefing-Vorlage: „Bitte 3 Weitwinkel-Aufnahmen bei Sonne, kein Gegenlicht, kein Selfie-Stil.“
Video-Generation braucht klare Prompts.	Erstes xAI-Video (leafgo-hero-scrub.mp4) wurde nie verwendet. Zweites (hero-header-scrub.mp4) brauchte mehrere Iterationen.	Standardisierte Video-Prompt-Templates für xAI Image-to-Video.
Subagenten brauchen Verifikation.	Foto-Analyse-Subagent erstellte Analyse-Datei im falschen Ordner — musste nachverfolgt werden.	Output-Verifikation als Standard-Gate nach jeder Delegation.
CSS inline → extern ist kein Luxus.	16 KB CSS im HTML macht die Seite bei jedem Reload schwerer und verhindert Caching.	CSS-Extraktion ab Projektstart als Default.
Client-Preview ist ein Produktivitätshebel.	Magnus konnte die Seite erst sehen, als Railway deployt war — vorher nur Nimar auf localhost.	Preview-Deploy in Stunde 1, nicht Stunde 40.

6. Aktueller Stand & Nächste Schritte

Was live ist

Komponente	Status	Details
leaf-go.de (Domain)	Ausstehend	Domain registrieren/DNS konfigurieren
Railway Deploy	✓ Live	leafgo-preview-production.up.railway.app
Client-Preview	✓ Geschützt	Basic Auth (leafgo/leafgo2026!)
Git-Repo	✓	github.com/Jind0la/leafgo-site
Alle Bilder	✓ WebP + srcset	36 Varianten in /img/
Video	✓ Komprimiert	577 KB hero-header-scrub.mp4

Offene Punkte für Magnus

#	Thema	Priorität	Notizen
1	Trockenmauer-Foto	Mittel	stone.jpg zeigt Pflaster, nicht Trockenmauer. Text sagt „Naturstein & Trockenmauern" — Erwartungsbruch. Sobald Magnus ein Mauer-Foto schickt: 2-Minuten-Fix.
2	E-Mail bestätigen	Mittel	info@leaf-go.de ist gesetzt (von Van-Beschriftung), aber nicht mit Magnus abgestimmt.
3	USt-IdNr.	Niedrig	Im Businessplan nicht gefunden. Impressum sagt explizit „nicht hinterlegt“.



4	Domain	Mittel	leaf-go.de registrieren, DNS auf Railway, SSL.
5	prefers-reduced-motion	Niedrig	Static-Poster-Fallback für Accessibility.

Moradbakhti-KI: Produkt-Reflexion

Leaf Go ist ein validiertes Playbook. Der Prozess — Client-Fotos analysieren, cineastischen One-Pager bauen, SEO+Recht abdecken, passwortgeschützt deployen — ist wiederholbar. Die Netto-Entwicklungszeit von ~5h bei einer Qualität, die Agenturen 3.000–8.000 € kostet, macht dieses Playbook zum Kernprodukt von Moradbakhti-KI: **KMU-Websites als KI-Agenten-Produkt.**

— Ende des Executive Summary —
